


## 1. 工事概要

本工事は 2025 年の大阪万博の開催に向けて、会場となる夢洲内の下水道施設を整備するものである。工事の内容は夢洲内の雨水管および污水管の開削工、推進工、ポンプ棟工（夢洲抽水所、舞洲抽水所）、夢洲から舞洲を結ぶ海底共同溝トンネルへの污水圧送管布設工、舞洲内での舞洲抽水所までの污水圧送管敷設工である。

- ①工事名：大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3
- ②工事場所：大阪府大阪市此花区夢洲・舞洲中地内・夢洲舞洲海底トンネル
- ③工事期間：令和3年12月16日～令和6年8月30日
- ④発注者：日本下水道事業団 近畿総合事務所
- ⑤請負者：大林組・大本組・久本組特定建設共同企業体  
現場代理人 佐田 荘一

本書では、夢洲抽水所において西側境界部の舗装撤去・復旧工を行い、完了したため、報告する。

## 2. 施工位置図

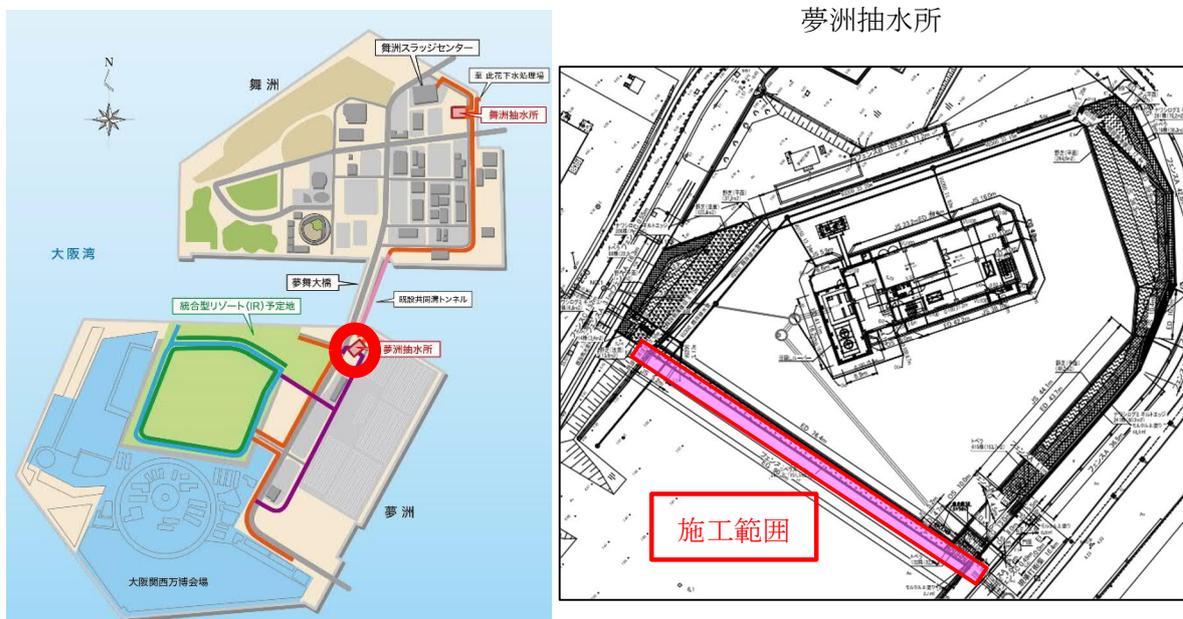



工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工事  
 工種 場内整備工 測点 夢洲抽水所

**舗装復旧工  
 路盤鋤取り状況**

写真タイトル: 舗装復旧工  
 路盤鋤取り状況



工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工事  
 工種 場内整備工 測点 夢洲抽水所

**舗装復旧工  
 路床出来形  
 GL-400**

写真タイトル: 舗装復旧工  
 路床出来形 GL-400



工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工事  
 工種 場内整備工 測点 夢洲抽水所

**舗装復旧工  
 路床出来形  
 GL-400**

写真タイトル: 舗装復旧工  
 路床出来形 GL-400



工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工事  
 工種 場内整備工 測点 夢洲抽水所  
**下層路盤工  
 RC-40 t=150**

写真タイトル: 下層路盤工 R  
 C-40 t=150



工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工事  
 工種 場内整備工 測点 夢洲抽水所  
**舗装復旧工  
 下層路盤工  
 RC-40  
 転圧状況**

写真タイトル: 舗装復旧工  
 下層路盤工 RC-40 転圧状況



工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工事  
 工種 場内整備工 測点 夢洲抽水所  
**舗装復旧工  
 下層路盤工  
 RC-40  
 転圧完了**

写真タイトル: 舗装復旧工  
 下層路盤工 RC-40 転圧完了



工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工事  
 工種 場内整備工 測点 夢洲抽水所  
**舗装復旧工**  
**下層路盤工**  
**RC-40 GL-250**

写真タイトル: 舗装復旧工  
 下層路盤工 RC-40 GL-250




工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工事  
 工種 場内整備工 測点 夢洲抽水所  
**舗装復旧工**  
**下層路盤工**  
**RC-40 GL-250**

写真タイトル: 舗装復旧工  
 下層路盤工 RC-40 GL-250



工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工事  
 工種 場内整備工 測点 夢洲抽水所  
**舗装復旧工**  
**上層路盤(HMS25)**  
**t=150mm**

写真タイトル: 舗装復旧工  
 上層路盤(HMS25) t=150mm

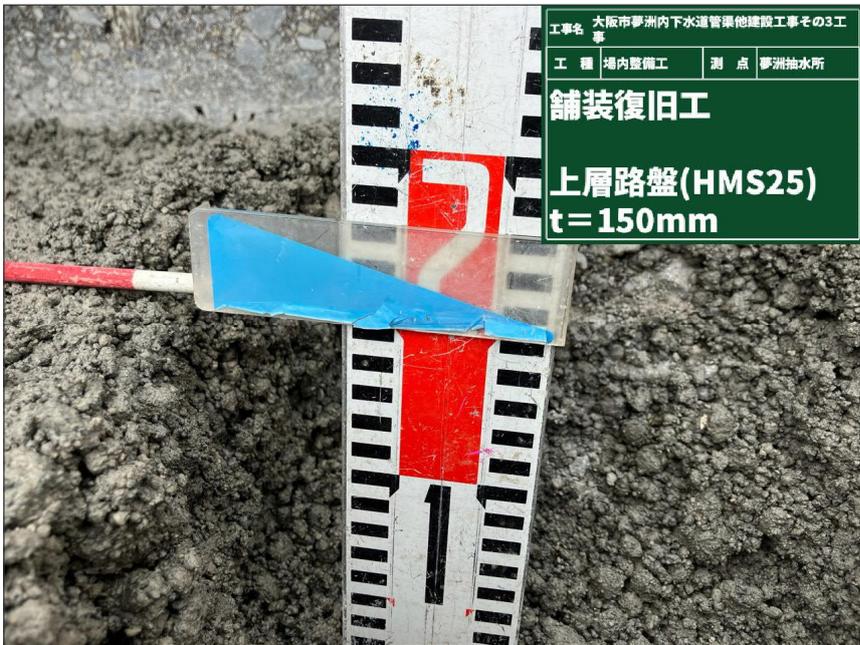

写真タイトル: 舗装復旧工  
上層路盤(HMS25) t=150mm



写真タイトル: 舗装復旧工  
上層路盤工 HMS25 GL-100



写真タイトル: 舗装復旧工  
上層路盤工 HMS25 GL-100




工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工  
 事  
 工 種 場内整備工 測 点 夢洲抽水所  
**西側①舗装復旧工**  
**プライムコート塗布状況**

写真タイトル: 舗装復旧工  
 プライムコート塗布状況



工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工  
 事  
 工 種 場内整備工 測 点 夢洲抽水所  
**西側②舗装復旧工**  
**プライムコート塗布完了**

写真タイトル: 舗装復旧工  
 プライムコート塗布完了

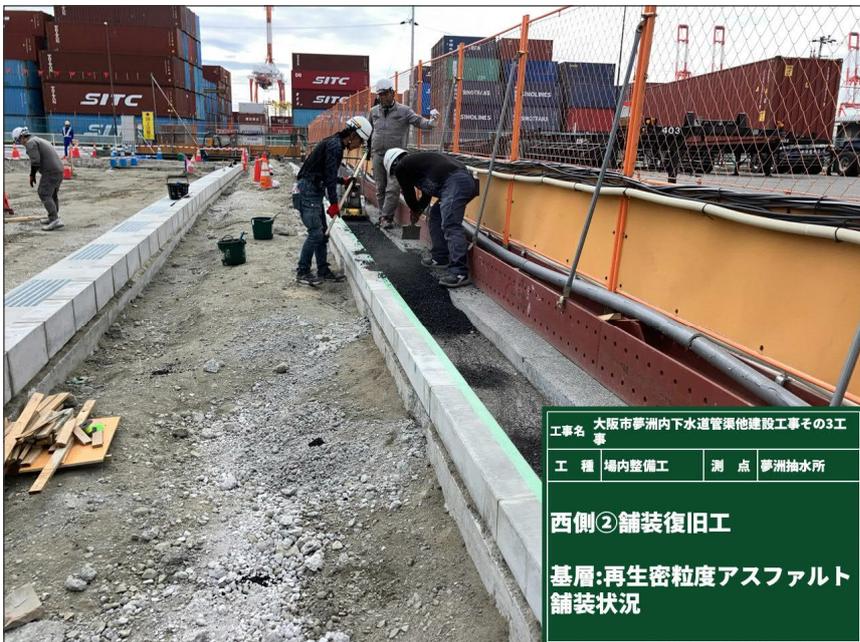

工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工  
 事  
 工 種 場内整備工 測 点 夢洲抽水所  
**西側②舗装復旧工**  
**基層:再生密粒度アスファルト  
 舗装状況**

写真タイトル: 舗装復旧工  
 基層 再生粗粒度アスファルト  
 敷均し状況  
 ※黑板誤記



工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工事  
 工種 場内整備工 測点 夢洲抽水所  
**西側①舗装復旧工**  
 基層:再生密粒度アスファルト  
 舗装状況

写真タイトル: 舗装復旧工  
 基層 再生粗粒度アスファルト  
 下 転圧状況  
 ※黒板誤記



工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工事  
 工種 場内整備工 測点 夢洲抽水所  
**西側②舗装復旧工**  
 基層:再生密粒度アスファルト  
 舗装完了

写真タイトル: 舗装復旧工  
 基層 再生粗粒度アスファルト  
 下 転圧完了  
 ※黒板誤記



工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工事  
 工種 場内整備工 測点 夢洲抽水所  
**西側②舗装復旧工**  
 基層:再生粗粒度アスファルト  
 舗装出来形確認  
 GL-50mm

写真タイトル: 西側(2)舗装復旧工  
 基層:再生粗粒度アスファルト  
 舗装出来形確認  
 GL-50mm



工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工事  
 工種 場内整備工 測点 夢洲抽水所  
**西側②舗装復旧工**  
 基層:再生粗粒度アスファルト  
 舗装出来形確認  
 GL-50mm

写真タイトル: 西側(2)舗装  
 復旧工 基層:再生粗粒度ア  
 スファルト 舗装出来形確認  
 GL-50mm



工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工事  
 工種 場内整備工 測点 夢洲抽水所  
**西側②舗装復旧工**  
 タックコート塗布状況

写真タイトル: 舗装復旧工  
 タックコート塗布状況



工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工事  
 工種 場内整備工 測点 夢洲抽水所  
**西側①舗装復旧工**  
 タックコート塗布完了

写真タイトル: 舗装復旧工  
 タックコート塗布完了



工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工  
 事  
 工 種 場内整備工 測 点 夢洲抽水所  
 境界～自由勾配側溝隣縁石B  
 西側②  
 表層:再生密粒度アスファルト  
 舗設状況

写真タイトル: 舗装復旧工  
 表層 再生密粒度アスファルト  
 下 敷均し状況



工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工  
 事  
 工 種 場内整備工 測 点 夢洲抽水所  
 境界～自由勾配側溝隣縁石B  
 西側②  
 表層:再生密粒度アスファルト  
 転圧状況

写真タイトル: 舗装復旧工  
 表層 再生密粒度アスファルト  
 下 転圧状況



工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工  
 事  
 工 種 場内整備工 測 点 夢洲抽水所  
 アスファルト 舗装  
 復旧完了

写真タイトル: アスファルト  
 舗装 復旧完了



写真タイトル: アスファルト  
舗装 復旧完了



写真タイトル: 仮設フェンス  
撤去状況



写真タイトル: 仮フェンス撤  
去完了



工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工事  
 工種 場内整備工 測点 夢洲抽水所

**仮フェンス撤去完了**

写真タイトル: 仮フェンス撤去完了



工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工事  
 工種 場内整備工 測点 夢洲抽水所

**フェンス設置完了**

写真タイトル: フェンス設置完了



工事名 大阪市夢洲内下水道管渠他建設工事その3工事  
 工種 場内整備工 測点 夢洲抽水所

**フェンス設置完了**

写真タイトル: フェンス設置完了
